



FIELD SUCCESS MASTER ROADMAP · V0.7

완성된 LAXS-M을 현장 성과로 정착시키는 단계별 도입·효과검증·확산 계획

원료매입·생산·판매·전사경영 업무키트가 하나의 전사 시나리오와 데이터·지식을 공유하는 LAXS-M을 현업 운영에 정착시키기 위한 실행 로드맵입니다. 기능 수가 아니라 사용자 채택, 데이터 신뢰, 의사결정 품질과 정량 효과를 확산 기준으로 삼습니다.

대상 LS MnM 초기 현장 적용

원칙 4개 업무키트 → 최대 10명 정착 → 30~50명 확장

VERSION 0.7

DATE 2026.08

현장 성공은 4개 업무키트가 전사 경영판단과 실행까지 이어지는 것입니다.

원료매입·생산·판매 부서가 각자 시뮬레이션하고, 그 결과가 같은 전사 시나리오에서 손익·현금흐름·영향 경로·의사결정·실행계획으로 조합되는 것을 첫 현장 성공 단위로 정의합니다.

4

초기 업무키트
원료매입·생산·판매·전사 통합 경영

10명

1단계 최대 사용자
Power User·데이터 오너·의사결정자 중심

0건

조직 범위 밖 노출
화면·API·생성 앱·온톨로지 동일 적용


100%

근거 추적 가능
기준선·인증판·산식·결정·발간 이력

정착 판정: 출시 전 로컬 브라우저 인수를 통과한 동일 시나리오를 최대 10명의 현장 사용자가 반복 실행하고, 같은 입력의 재현성·업무시간 단축·의사결정 품질·데이터 범위 통제를 실제 로그로 확인합니다.

현장 운영을 시작할 제품·업무·데이터 근거가 준비되어 있습니다.

아래는 LAXS-M의 실제 운영 화면입니다. 시연 수치는 DEMO/SYNTHETIC으로 표시하고, 현장 적용에서는 승인된 실적·시나리오·효과 기준선을 구분해 관리합니다.

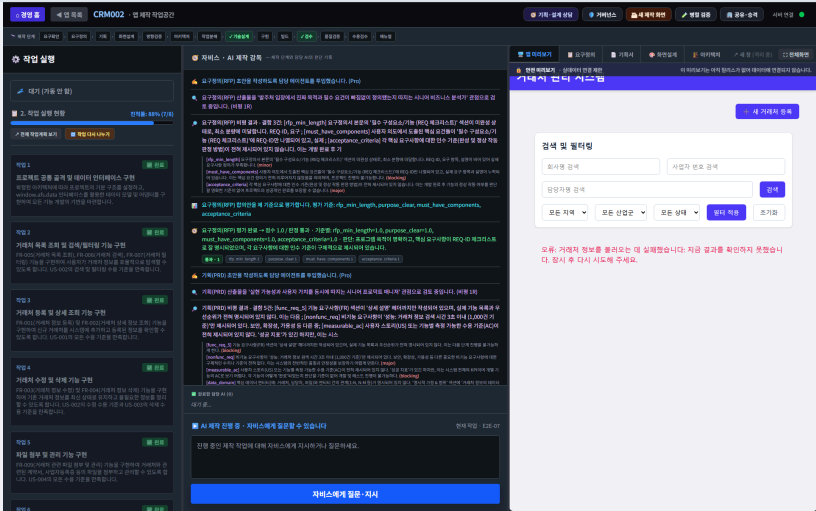

현업 SW 생성

WBS·AI 제작 스트림·실행 앱 미리보기



React Flow

업무 온톨로지

승인된 객체와 영향 관계 그래프

SCENARIO RESULTS			
기준 대비 영향			
시연을 합성 데이터(DEMO/SYNTHETIC) 기준선 — 실적이 아닙니다			
기준시점 2026-08-24 01:44			
생산량 7,200 ton 기준 대비 -4,800	기발재고 7,000 ton 기준 대비 +4,800	구매지급 86,940,000,000 원 기준 대비 +2,940,000,000	기발현금 41,454,400,000 원 기준 대비 -10,545,600,000
결과	기준	시나리오	변화
생산량 ton	12,000	7,200	-4,800 -40%
기발재고 ton	2,200	7,000	+4,800 +218.1818%
구매지급 원	84,000,000,000	86,940,000,000	+2,940,000,000 +3.5%
기발현금 원	52,000,000,000	41,454,400,000	-10,545,600,000 -20.28%
영업이익 원	18,000,000,000	10,394,400,000	-7,605,600,000 -42.2533%
산식 1.0.0 · 기준선 지문 b245687cfd8a · 결과 지문 2e8f84813218			

경영 시뮬레이션

12일 지연의 생산·재고·현금·이익 영향


대외 발간본	
원료 도입 12일 지연에 대응해 9월 생산·출하 계획을 조정할 것인가	
결정 결과 CONDITIONAL · v1	
executive_brief	
구분	DEMO/SYNTHETIC — 실제 실적이 아닙니다.
결과	대체 선적 확보와 고마린 수주 우선 확보를 조건부 승인
핵심 영향	생산량 12,000 → 7,200 ton, 영업이익 180.0 → 103.9억원
실행 책임	SCM본부 · 생산본부 · 영업본부 공동
financial_impact	
1 지표	생산량
기준	12,000 ton
시나리오	7,200 ton
변화	-40.0%
2 지표	기발재고
기준	2,200 ton
시나리오	7,000 ton
변화	+218.2%
3 지표	구매지급
기준	840.0억원
시나리오	869.4억원
변화	+3.5%

대외 보고본

결정·수치·조건·승인 게이트를 문서로 렌더링

현장 적용은 10개 관문을 운영 Gate로 관리합니다.

회사·조직·업무키트·인증판·온톨로지·계산·결정·실행·효과 측정의 근거를 순서대로 연결합니다. 앞 단계의 데이터와 권한이 바뀌면 뒤 단계 결과도 자동으로 재검증합니다.

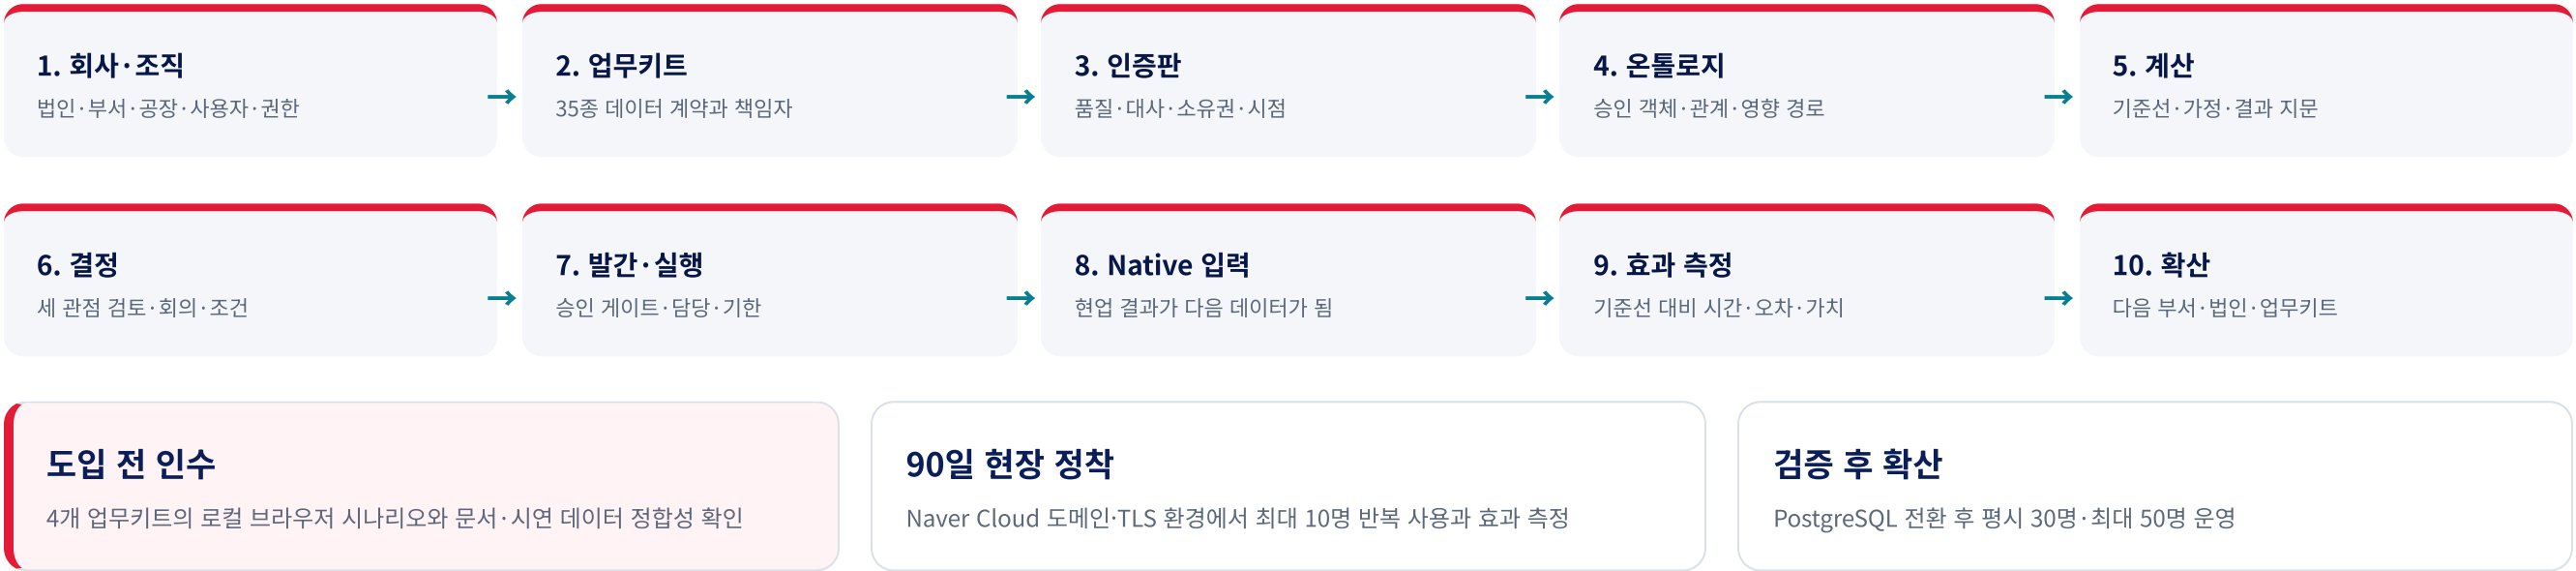

90일 현장 정착은 사용성과 경영효과를 검증하는 운영 단계입니다.

도입 시작 시 기준선을 확정하고 Shadow 운영과 실제 사용자 반복을 통해 업무시간·의사결정 품질·재무 효과·운영비의 개선량을 측정합니다.

기간	핵심 활동	산출물	통과 기준
W0-2	대표 질문·책임자·조직 범위·현재 업무 기준선 확정	현장 적용 Charter, 사용자 최대 10명, KPI 정의서	데이터 오너·현업 책임자·결정권자 승인
W3-5	회사 정본·조직·업무키트 책임자·데이터 소유권 결속	회사별 데이터 결속, 인증판, 승인 관계 그래프	원천 대사 허용오차, 범위 밖 노출 0건
W6-8	과거 기간 Replay와 실제 업무 Shadow 실행	재현 결과, 오류·누락·수정 기록	동일 입력 동일 결과, 근거 추적 100%
W9-11	사용자 10명 반복 사용·회의·발간 완주	사용 로그, 결정 패키지, 보고서	핵심 업무 성공률·교육 이수·재작업 감소
W12-13	정량 효과·운영비·위험 검토	효과 검증서, 확산/보완/중단안	사전 합의 KPI와 비용 상한 충족

현장 적용 데이터는 실적과 DEMO/SYNTHETIC을 화면과 보고서에서 명확히 구분합니다. 합성 결과를 실제 성과로 보고하지 않고, 실제 효과는 승인된 기준선과 사후 실측으로만 확정합니다.

ROI는 기준선·실행 로그·사후 실측을 같은 정의로 비교합니다.

‘AI를 도입했다’가 아니라 의사결정 리드타임, 데이터 준비 시간, 오류·재작업, 재고·현금·수율 개선 가능액과 운영비를 측정합니다.

업무 생산성

- 질문 접수→결정까지 시간
- 데이터 취합·대사 시간
- 보고서 작성·수정 시간
- 수작업 전환·재작업 횟수

경영 품질

- 계획 대비 실적 오차
- 예측 편향과 보정 횟수
- 재고·운전자본 개선 가능액
- 결정 조건 이행률


운영 경제성

- 사용자·안전당 LLM 비용
- 인프라·저장소·어댑터 비용
- 오류 1건 수정 소요
- 사용자 채택·반복 사용률

지표	시작 기준선	90일 정착 목표	증거
결정 리드타임	착수 시 4주 실측	20% 이상 단축	질문·회의·결정 타임스탬프
자료 취합 시간	현행 수작업 시간	30% 이상 단축	인증판 생성·대사 로그
재현성	측정 불가	동일 입력 결과 100% 일치	기준선·결과 지문
범위 오류	신규 기준	0건	PDP·감사 원장

소수정예 제품 셀과 현업 데이터 오너가 함께 운영합니다.

기술팀만의 프로젝트로 두지 않고 업무 책임·데이터 책임·제품 책임·운영 책임을 분리해 승인과 개선 속도를 동시에 확보합니다.

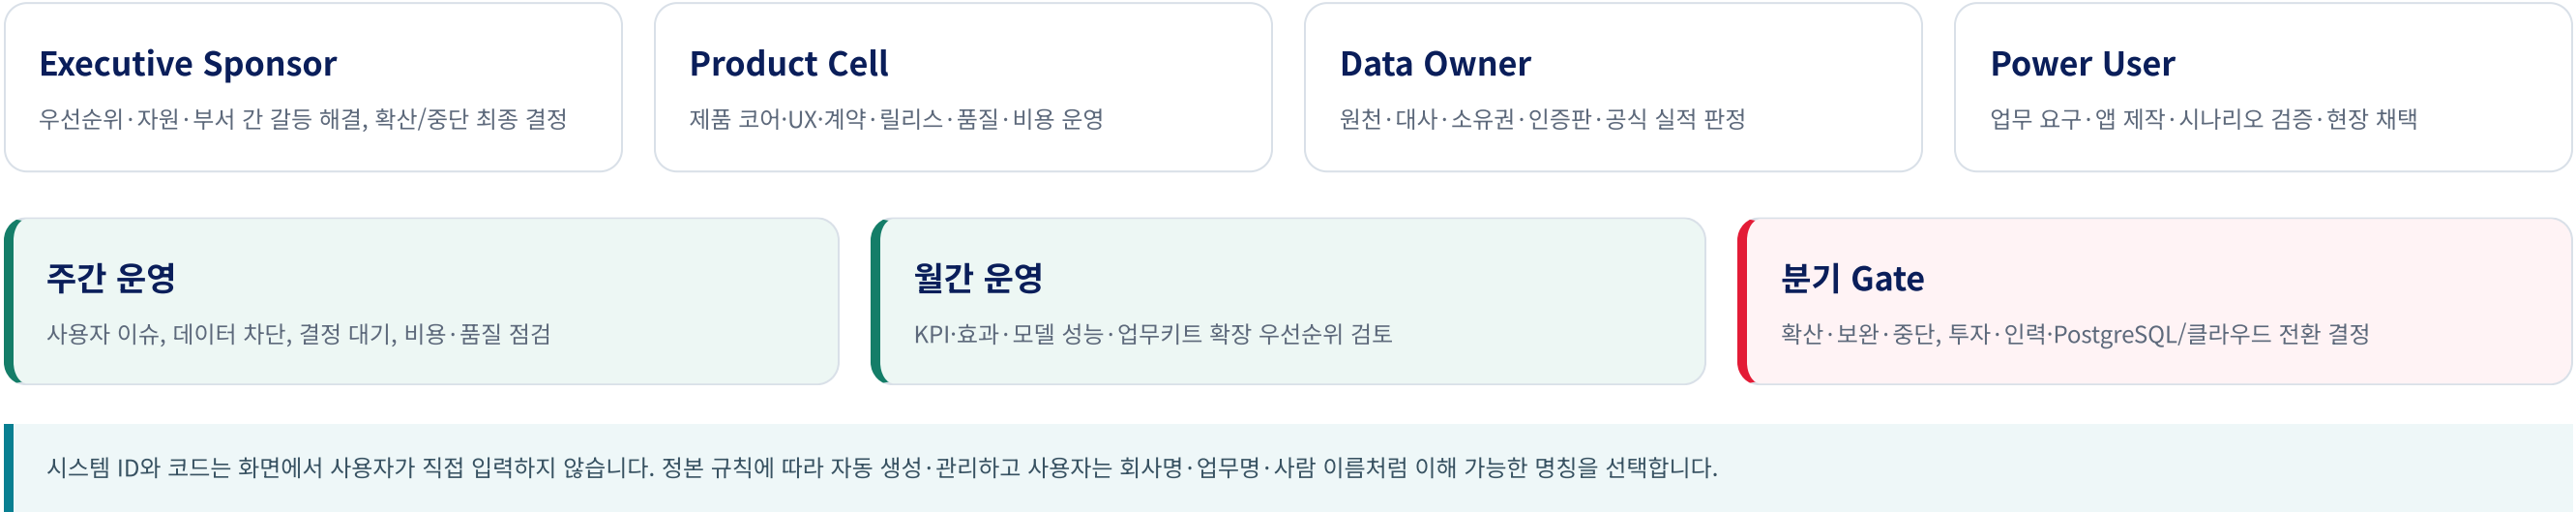

사용자 규모에 따라 인프라와 데이터베이스를 단계적으로 전환합니다.

초기 적용 비용을 최소화하되 동시사용·백업·복구·감사 요구가 커지는 시점에는 SQLite를 고집하지 않습니다.

단계	사용 규모	권장 구성	전환 조건
출시 전 인수	내부 품질·운영 담당	단일 통합 데이터, 로컬 웹·API, SQLite	4개 업무키트 브라우저 시나리오·운영 데이터 무오염
1단계 현장 적용	최대 10명	Naver Cloud 소형 VM, 도메인·TLS, 앱/DB 백업, 제한 접속	현장 적용 Charter·보안 검토·복구 실증
2단계 확장	평시 30명·최대 50명	PostgreSQL, 앱/DB 분리, 모니터링, 정기 백업·복구	동시 쓰기·응답시간·감사·가용성 기준 초과
그룹 확산	복수 법인·사업부	고가용성 DB, SSO, 망·보안 연계, DR, 표준 운영 SLA	법인별 데이터 경계·운영 책임·비용 모델 승인

비용 최소화

초기 적용은 단일 저사양 인스턴스와 자동 중지·사용량 상한으로 운영합니다.

데이터 안전

운영 데이터와 시험 데이터는 하나의 정본 규칙을 쓰되, DEMO/SYNTHETIC 표식을 잃지 않습니다.

복구 우선

마이그레이션보다 먼저 백업 사본에서 복원을 1회 실증합니다.

NEXT DECISION

첫 번째 의사결정은 최대 10명의
90일 현장 정착을 승인하는 것입니다.

출시 전 브라우저 인수와 Naver Cloud 도메인·TLS·복구 검증을 마친 동일 시스템으로 현장 사용을 시작합니다. 효과·보안·재현성·복구 기준을 통과한 업무키트와 조직만 다음 규모로 확장합니다.

도입 승인

4개 업무키트·최대 10명·90일 효과 측정 범위 확정

90일 정착

반복 사용·정량 효과·현업 Native 입력·운영비 측정

검증 후

PostgreSQL·30~50명 확장·그룹 표준화

운영에서는 AI 설명이 아니라 통과 증거를 확인합니다.

학습·외부 전송·RAG 품질의 일반 설명은 단일 Q&A 정보으로 분리하고, 이 로드맵에는 현장 적용을 열거나 막는 증거만 남깁니다.

Gate	통과 증거	실패 시 조치
Learning	개선 전후 고정 평가세트·승인 버전·롤백	운영 승격 금지
Data Egress	등급별 차단·마스킹·보존 설정·호출 감사	외부 모델 호출 차단
RAG Quality	근거 인용률·오답/누락 평가·권한 밖 노출 0건	Knowledge Pack 격리·재색인

설명 정보: [AI 학습·데이터 보호·RAG Q&A v0.7](#). 운영 계약에서는 공급자·리전·보존·서드파티 연결 조건을 정기적으로 재확인합니다.
